

安全パトロール

巡視日：2024年3月21日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 阿波根昌邦 様 住宅新築工事
- ・ 野原朝貞 様 二世帯住宅新築工事
- ・ 稲福勉 様 住宅新築工事
- ・ 松田さくら 様 住宅兼事務所新築工事



A班

巡視者：新垣 七海

現場名：阿波根昌邦様 住宅新築工事

建設地：那覇市寄宮 地内


規模：WRC造、3階建て

代理人：伊礼



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 現地KY活動が未実施
- 整理整頓について
 - 建物周辺部に不要材
 - 資材の仮置き等未整備、建て込み後要整理
 - 二階部分の整理不足
- 墜落転落について
 - 足場上に不要材あり
 - 脚立足場、梯子など建て込み後に要整理

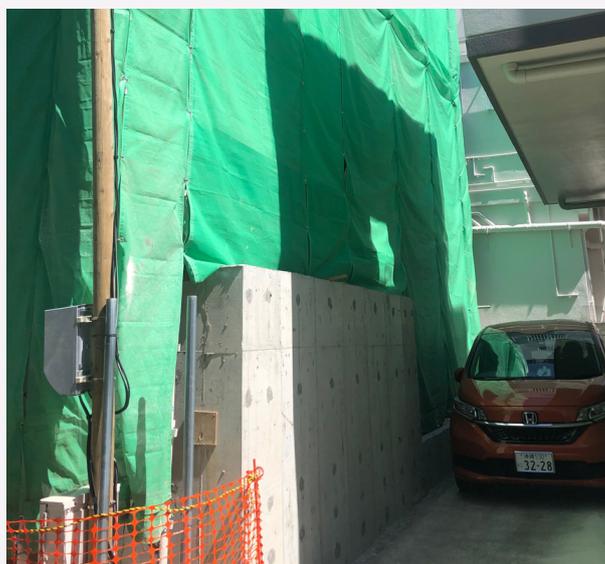

安全衛生指数：82%（安全面：88% 衛生面：75%）

A班

巡視者： 新垣 七海

現場名： 野原朝貞 様 二世帯住宅新築工事

建設地： 中城村南上原 地内


規模： WRC造、2階建て

代理人： 金城 晃也



※ 指摘事項

- 整理整頓について
 - 建物周辺にて、コンガラ、GLボンドの放置あり
- 墜落転落について
 - 開口部に手摺りなし
 - 足場の手摺り、筋交い不足あり
 - 端末部の転落防止手摺要設置
 - 手摺り、中棧、巾木の不足あり
 - シートの弛み、めくれあり

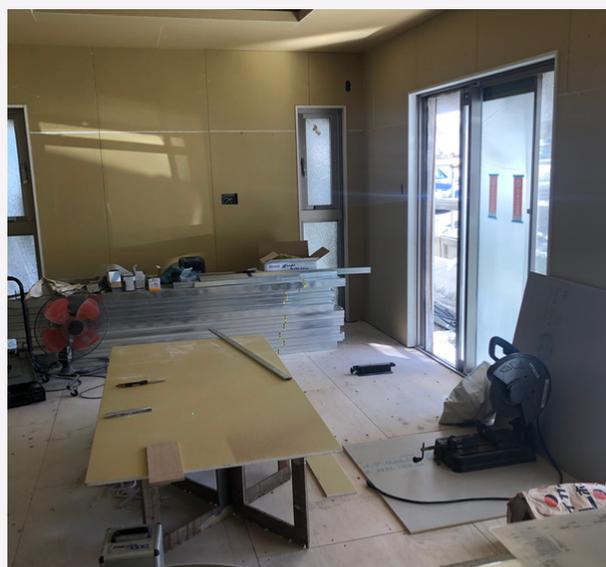

安全衛生指数：87%（安全面：82% 衛生面：91%）

B班

巡視者： 屋比久 翔一

現場名： 稲福勉 様 住宅新築工事

建設地： 嘉手納町字水釜 地内


規模： WRC造、2階建て

代理人： 津嘉山 健



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 現地KY活動の未実施、未記入
- 整理整頓について
 - CD管引き上げ、通路セメントノロの清掃、工具洗い場の検討
 - 作業通路の整理整頓要
 - 建物内部の不要材の引き上げ要
 - 仮設トイレの清掃要
 - 産廃の分別がされていない
 - 加工場所を決め、加工クズが散らばらないように整備する事
- 墜落転落について
 - 吹抜け階段の開口部に転落防止措置要
 - 足場の手摺り、屋上栈橋の復旧要
 - 手摺り、中棧、巾木の不足あり
- 車両系、機械系について
 - 工事車両の車止め措置要

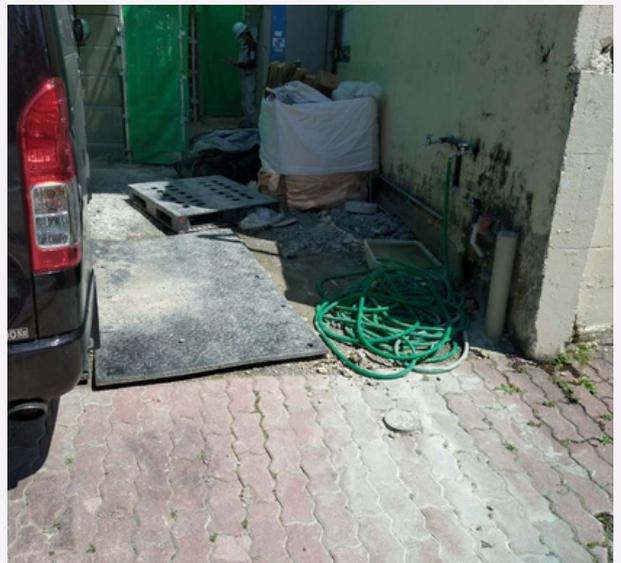

安全衛生指数：56%（安全面：81%、衛生面：30%）

B班

巡視者：屋比久 翔一

現場名：松田さくら様 住宅兼事務所新築

建設地：北谷町伊平 地内

規模：RC造、4階建て

代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 現地KY活動の未実施
 - **作業員のノーヘル!**
 - 週間工程表が更新されていない
- 整理整頓について
 - 不要材の搬出要
 - 型枠解体後の清掃要
 - 弁当ガラ、飲み物ガラの持ち帰り徹底
- 墜落転落について
 - EVシャフトの墜落転落対策要
 - 足場の手摺り、筋交い、巾木など、多数の不備あり
 - シートの弛みたわみ、養生紐の未結束
 - 足場の根がらみの再調整要
 - 積載荷重の表示なし
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示の文字が薄れている



安全衛生指数：48%（安全面：45%、衛生面：50%）
