

安全パトロール

巡視日：2025年03月20日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・細井アンナ様 共同住宅新築工事
- ・伊波恵子様 宿舎新築工事
- ・アミューズメント沖縄様 貸住宅新築工事
- ・比嘉航平様 貸住宅新築工事
- ・エンシエイト様 貸住宅新築工事



A班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：細井アンナ様 共同住宅新築工事

建設地：金武町屋嘉 地内

規模：WRC造、3階建て

代理人：平田 一希



※ 指摘事項

● 施工管理について

- 工事完了していないのに工事看板が撤去されてしまっている
- 週刊工程表の掲示なし
- KY活動実施なし
- 第三者の立ち入り禁止措置対策なし
- 消化器の未設置

● 整理整頓について


- 建物周辺部などの不用材の撤去要
- 産廃の未分別

● 墜落転落について

- 階段吹き抜け、ベランダ等に転落防止柵の設置緊急

● 電気災害について

- 取扱責任者表示が薄れて読めない

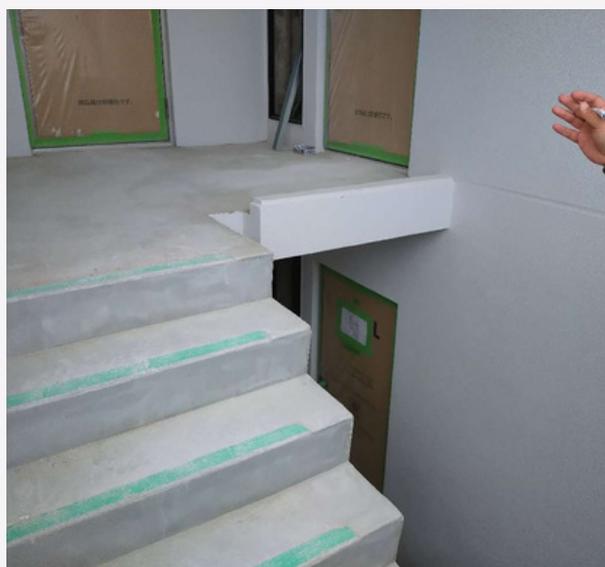

安全衛生指数：56%（安全面：52% 衛生面：60%）

A班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：伊波恵子様 宿舎新築工事

建設地：金武町屋嘉 地内


規模：WRC造、3階建て

代理人：津嘉山 健



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 現地KY活動実施なし
 - 第三者の立ち入り禁止表示要
- 整理整頓について
 - 鉄筋、型枠の不溶剤の引き上げ要
 - 仮設トイレの清掃が未
 - 支給品以外のゴミは持ち帰り！
- 墜落転落について
 - 内部階段など吹抜け部の転落防止対策
 - 作業中に外した足場が未復旧
 - 積載荷重表示の記載なし
 - 建物と足場の隙間が不適切あり
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示が薄れて読めない
- 車両、機械系について
 - 工事車両の車止め対策なし
- 近隣への配慮について
 - 粉塵対策、飛散防止の対策なし

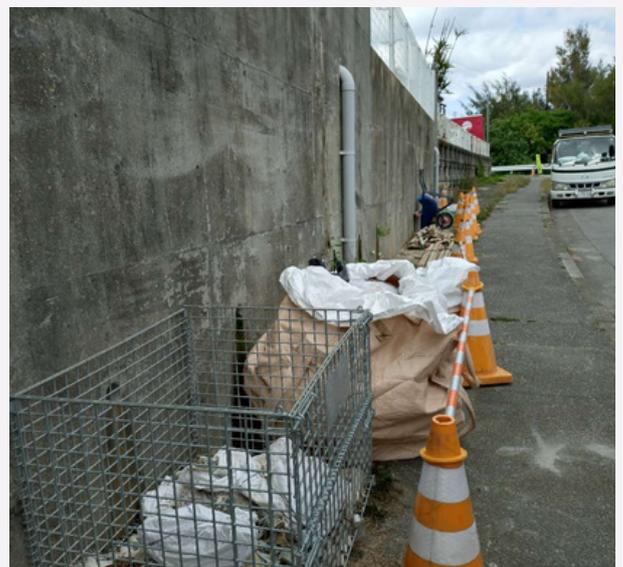

安全衛生指数：38%（安全面：64% 衛生面：11%）

A班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：アミューズメント沖縄様 貸住宅

建設地：金武町屋嘉 地内


規模：WRC造、2階建て

代理人：平田 一希



※ 指摘事項

- 施工管理について
 - 週間工程表の未更新
- 整理整頓について
 - 足場材に型枠のサポートを立て掛けると危険
 - 足場上の不用材は撤去する事
 - 産廃の未分別（支給品以外は持帰り）
- 墜落転落について
 - 作業中に外したブレス等が未復旧
 - 巾木の設置なし
 - 積載荷重表示の記載なし
 - 建物と足場の隙間が不適切あり
- 電気災害について
 - 取扱責任者表示が薄れて読めない
- 近隣への配慮について
 - 粉塵、騒音対策の足場シート無し
 - 飛散物の飛散防止措置対策なし

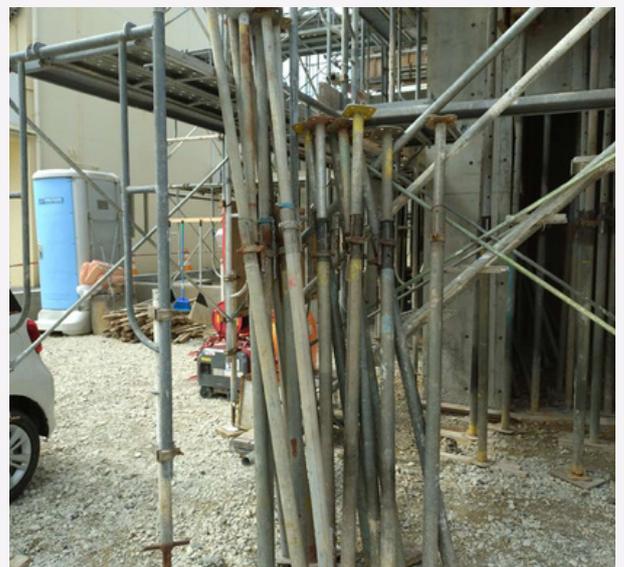

安全衛生指数：57%（安全面：70% 衛生面：44%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：比嘉航平様 貸住宅新築工事

建設地：沖縄市上地 地内

規模：WRC造、2階建て、2棟

代理人：下里 次監



※ 指摘事項

● 施工管理体制について

- 緊急時連絡体制、有資格者表示なし
- KY活動の未実施
- 第三者の立ち入り禁止措置なし
- 危険区域への立ち入り禁止措置なし

● 整理整頓について

- 現場内に不用材多数
- 仮設通路の安全確保が出来ていない
- 仮設トイレの臭いあり

● 墜落転落について

- 端部未の転落防止対策が未施工あり
- 作業中に外した手摺り等が未復旧
- シートの弛みや、めくれ等多数あり
- 積載荷重表示なし

● 近隣への配慮について

- 作路に材料敷地前面にあり、導線が取れていない
- 仮設トイレから悪臭あり



安全衛生指数：54%（安全面：58% 衛生面：50%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：エンシエイト様 貸住宅新築工事

建設地：沖縄市上地 地内


規模：WRC造、3階建て、2棟

代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 有資格者表示なし
 - KY活動の未実施
 - 第三者の立ち入り禁止措置なし
 - 週刊工程表の更新記載なし
- 整理整頓について
 - 敷地内及び、建物内の整理整頓が要
 - 資材の仮置きに不備あり
 - 仮設トイレの臭いあり
- 墜落転落について
 - 端部未の転落防止対策が未施工あり
 - 作業中に外した手摺り等が未復旧
 - シートの弛みや、めくれ等多数あり
 - 積載荷重表示なし
 - 足場と建物の隙間が大きい箇所あり
- 近隣への配慮について
 - 仮設トイレから悪臭あり
 - 打設前の告知挨拶など無し

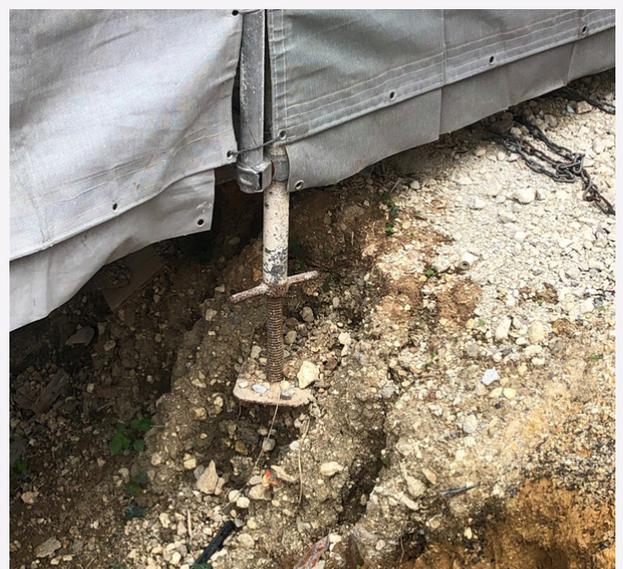

安全衛生指数：54%（安全面：54% 衛生面：54%）
