

安全パトロール

巡視日：2024年2月15日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めています。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 比嘉直樹 様 二世帯住宅兼貸住宅新築工事
- ・ 松田さくら 様 事務所新築工事
- ・ 我那覇真・良子 様 店舗兼二世帯住宅新築工事
- ・ 屋嘉比盛人 様 住宅兼共同住宅新築工事



A班

巡視者：屋比久 翔一

現場名：比嘉直樹 様 二世帯住宅兼貸住宅

建設地：読谷村字波平 地内

規模：WRC造、2階建て

代理人：平田 一希



※ 指摘事項

● 施工管理体制について


- 労災関係成立票、緊急時連絡先、作業主任者、現地KY活動が未実施・表示なし
- 第三者の立入禁止措置なし
- 週間工程表の更新なし

● 整理整頓について

- 建物周辺部に釘の散乱
- 仮設トイレの清掃が必要
- 産業廃棄物の分別がされていない

● 近隣への配慮について

- 歩道へ資材等のはみ出しあり
- 足場ネットを躯体天端まで延長が必要
- 仮設トイレの清掃要

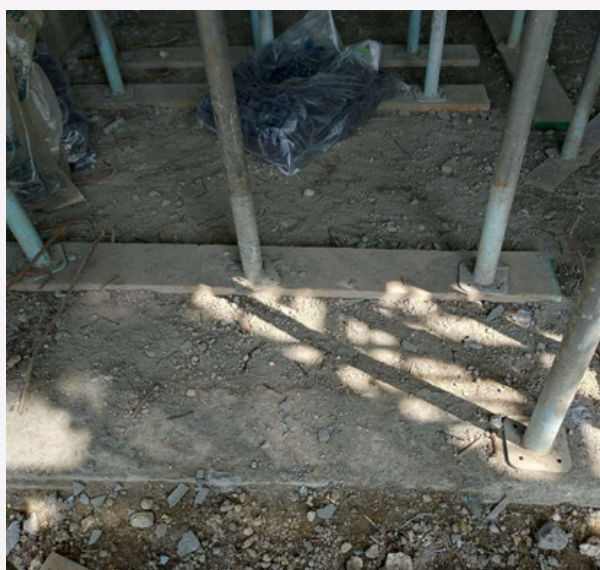

安全衛生指数：58%（安全面：76% 衛生面：40%）

A班

巡視者：屋比久 翔一

現場名：松田さくら様 事務所新築工事

建設地：北谷町伊平 地内

規模：WRC造、3階建て

代理人：宮里 宏太



※ 指摘事項

- 管理体制について
 - 社旗、安全旗の未掲揚
 - 危険物(燃料携帯缶)が未管理
- 整理整頓について
 - 建物周辺部及び、建物内部への釘、タバコ、空き缶、ペットボトルのゴミ等が散乱している
 - 加工クズの集塵対策が未実施
- 墜落転落について
 - EVシャフトの転落対策が未実施
 - ブレスの外れ、中棧の未設置あり
 - 足場シートのたわみ
 - 積載荷重表示なし
 - 足場の作業床の隙間が多い
- 車両系、機械工具について
 - 通信線が足場に接触している
- 近隣への配慮について
 - 前面道路にスロープがはみ出している
 - 側溝の養生がされていない



安全衛生指数：45%（安全面：66% 衛生面：25%）

B班

巡視者：多和田 真人

現場名：我那覇真・良子様 店舗兼二世帯住宅

建設地：沖縄市中央 地内

規模：WRC造、4階建て

代理人：津嘉山 健



※ 指摘事項

● 墜落転落について

→ 足場の手摺り、筋交いの外れあり



安全衛生指数：95%（安全面：91%、衛生面：100%）

B班

巡視者：多和田 真人

現場名：屋嘉比盛人様 住宅兼共同住宅

建設地：沖縄市照屋 地内

規模：WRC造、3階建て

代理人：下里 次監



※ 指摘事項

- 整理整頓について
 - 建物周辺部及び、建物内部の清掃要
- 墜落転落について
 - 足場の手摺り、筋交いの外れあり
 - 端末部の転落防止措置要
 - シートのたわみあり
 - 足場ジャッキの施工不良あり
- 崩壊倒壊について
 - 掘削面の安全勾配が不適切
 - 山留めが必要
 - 法面保護が必要
- 近隣への配慮について
 - 粉じん対策に一部不備あり
 - 側溝の養生が必要



安全衛生指数：74%（安全面：78%、衛生面：69%）
