

# 安全パトロール

巡視日：2024年5月16日(木)



## 無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

### ■ 今月のパトロール現場

- ・ K&S 様 共同住宅新築工事
- ・ 岸本貴暁 様 住宅新築工事
- ・ 中玉利澄男 様 2世帯住宅新築工事
- ・ 親富祖 卓・成海 様 2世帯住宅新築工事
- ・ 嘉手川 千央 様 住宅新築工事



# A班

巡視者： ●●●●●

現場名： K&S 様 共同住宅新築工事

建設地： 恩納村字恩納6979番1

規模： RC造、4階建て

代理人： 松本 伸



## ※ 指摘事項

### ● 所見について

- 住宅地の中でなおかつ狭小な敷地条件。施工難易度はかなり高い物件かと思えます。
- にもかかわらず駐車場の確保できておらず、建物規模に対して一度に投入できる作業員が限られており今後工程にも影響が出てもおかしくありません。早急に駐車場の確保をお願いします。

安全衛生指数：100%（安全面：100% 衛生面：100%）



# A班

巡視者： ●●●●●

現場名： 岸本貴暁 様 住宅新築工事  
建設地： 名護市字屋部名登川1264番1  
規模： WRC造、2階建て  
代理人： 玉城 剛



## ※ 指摘事項

### ● 施工管理体制について

- 建設業許可票、確認看板等、労災保険成立票、緊急時連絡体制表、作業主任者、現地KY等が未記入
- シート看板が古い為、交換が必要
- 第三者の立ち入り禁止措置なし
- 週間工程表が未記入
- 消火器の未設置

### ● 整理整頓について

- 足場板、脚立が放置されている
- 産業廃棄物の未分別

### ● 墜落転落について

- 養生シートが不十分、めくれ多数
- 壁繋ぎなし

### ● 近隣への配慮について

- 一般通路および、工事用通路が不備
- 粉塵対策（養生ネット）の不足



安全衛生指数：54%（安全面：48% 衛生面：60%）

# B班

巡視者： 屋比久 翔一

現場名： 中玉利澄男 様 2世帯住宅新築工事

建設地： 浦添市城間四丁目3 1 9 2 番 1 3

規 模： WRC造、2階建て

代理人： 平良 哲也



## ※ 指摘事項

- 整理整頓について
  - 現場周辺部の鉄筋資材の片付け要
- 墜落転落について
  - シート看板が紐の外れにより数力所めくれ



安全衛生指数：92%（安全面：95%、衛生面：89%）



# B班

巡視者：屋比久 翔一

現場名：親富祖 卓・成海 様 2世帯住宅新築工事  
建設地：浦添市経塚区画整理74街区12-1、12-2  
規模：RC造、2階建て  
代理人：親富祖 明



## ※ 指摘事項

- 施工管理体制について
  - 作業員のノーヘル！／その場で是正済
  - 週間工程表の未設置
  - 消火器の未設置
- 整理整頓について
  - 現場周辺、作業通路の整頓要
  - 仮設トイレの清掃要
  - 産業廃棄物の分別が必要
- 墜落転落について
  - 土間からの差し筋及び、鉄板の段差
- 車両系、機械工具について
  - 工事車両の車止め要
- 近隣への配慮について
  - 産業廃棄物の飛散防止対策要
  - 仮設トイレの臭いあり



安全衛生指数：56%（安全面：73% 衛生面：40%）

# B班

巡視者：屋比久 翔一

現場名：嘉手川千央様 住宅新築工事

建設地：那覇市前島1丁目4番8


規模：RC造、3階建て

代理人：金城 晃也



## ※ 指摘事項

- 施工管理体制について
  - 作業主任者の未表示
  - 現地KY活動の未実施
  - 型枠解体中につき、関係者以外の立入禁止表示要
- 整理整頓について
  - 仮設トイレの清掃要
  - 各自ゴミは持ち帰り指導要
- 墜落転落について
  - 足場作業床の隙間が大きい
- 近隣への配慮について
  - 仮設トイレの清掃要

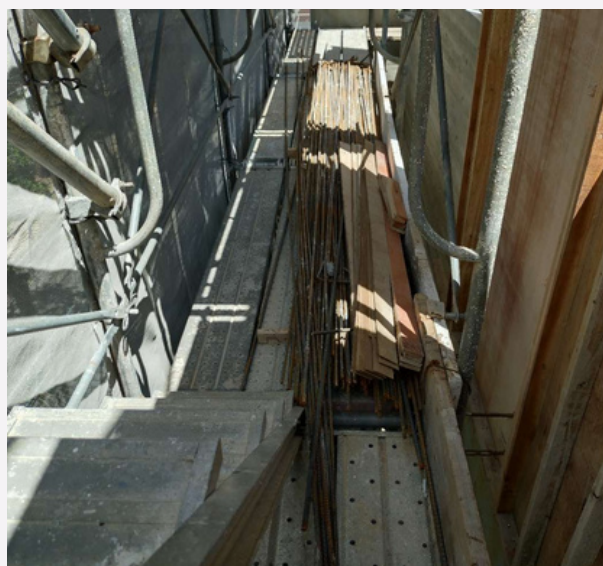

安全衛生指数：73%（安全面：85% 衛生面：60%）
