

安全パトロール

巡視日：2025年10月16日(木)



無事故、無災害を目指して

お客様の大切な財産を預かる仕事の中で、工事現場はたくさんの協力業者さん、職人さんと関わりながら、長い時間をかけて工事を進めていきます。

だからこそ、現場で働く方々が安心して、安全に作業が出来る様に整えていく必要がある為、定例で安全パトロールを行い、是正・改善に努め、無事故・無災害で施主様へ引き渡し出来るよう取り組んでいます。

■ 今月のパトロール現場

- ・ 照屋林賢 様 共同住宅兼スタジオ新築工事
- ・ 桑江分譲Ⅳ 新築工事（2棟）
- ・ N様 貸住宅新築工事
- ・ 花城優輝 様 二世帯住宅兼店舗新築工事



A班

巡視者：(株)アイムホーム 屋比久 翔一
新正組 宮里 様
応工業 仲松 様

現場名：照屋林賢 様 共同住宅兼スタジオ
建設地：北谷町伊平 地内
規模：RC造、5階建て
代理人：上江洲 裕人



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 消化器の設置なし
- 整理整頓について
 - 建物周辺部に不要材、ごみ散乱が多数あり
 - 安全通路の確保が出来ていない
 - 仮設トイレの清掃要
 - 産廃の置き場所を決め分別を徹底する
- 墜落転落について
 - 1階EVシャフト部に転落防止策の設置
 - 手すり、筋交の復旧要
 - シートのめくれなどあり
 - 足場の固定が必要
 - 積載荷重表示なし
 - 作業床の隙間が大きい
- 近隣への配慮について
 - 車道に資材がはみ出している
 - 側溝養生及び、全面道路の清掃要



安全衛生指数：45%（安全面：72% 衛生面：17%）

A班

巡視者：(株)アイムホーム 屋比久 翔一
新正組 宮里 様
応工業 仲松 様

現場名：桑江分譲Ⅳ 新築工事（2棟）

建設地：北谷町桑江 地内

規模：WRC造、2階建て

代理人：津嘉山 健




※ 指摘事項

● 整理整頓について

- 資材等は決めた場所以外に置かない
- 安全通路の確保要
- 次工程には清掃して渡す
- 支給品以外の産廃は持ち帰り

● 墜落転落について

- 高低差がある部分には転落防止柵を設ける事

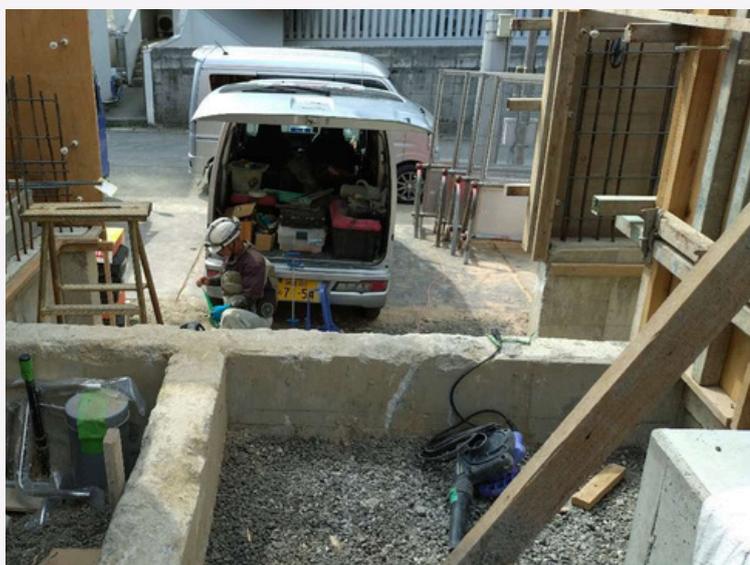

安全衛生指数：79%（安全面：94% 衛生面：64%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：N様 貸住宅新築工事

建設地：北谷町吉原 地内

規模：WRC造、2階建て

代理人：平田 一希



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 消化器の設置なし
- 墜落転落について
 - シートのたわみあり
 - 一部、巾木なし
 - 積載荷重表示なし
 - 構造物と足場の隙間が大きい箇所あり
- 電気災害について
 - 電線の養生を行う必要あり
- 近隣への配慮について
 - 仮設トイレの清掃が必要



安全衛生指数：88%（安全面：84% 衛生面：92%）

B班

巡視者：(株)アイムホーム

現場名：花城優輝 様 二世帯住宅兼店舗

建設地：北谷町上勢頭 地内


規模：WRC造、2階建て

代理人：下里 次監



※ 指摘事項

- 施工管理体制について
 - 安全帯の不使用者 1 名
 - 消火器の設置なし
- 整理整頓について
 - 足場通路に階段型枠材が置かれている
- 電気災害について
 - 取扱責任者の記載なし

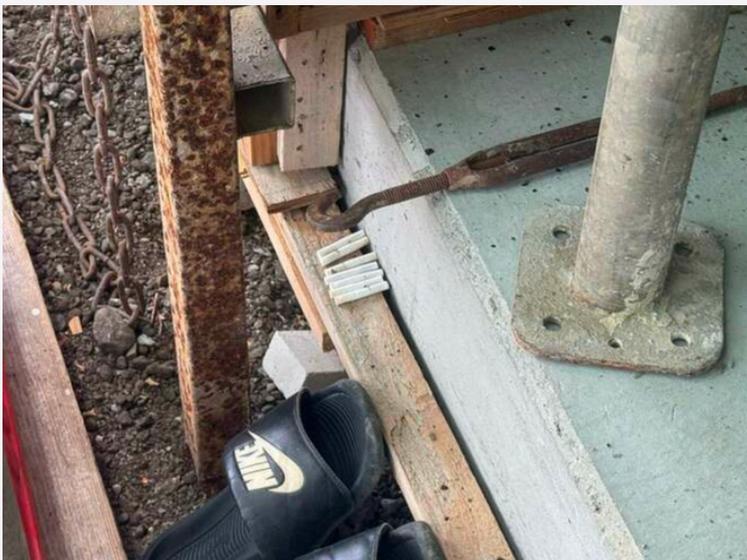

安全衛生指数：91%（安全面：89% 衛生面：92%）
